ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜ-Θ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΜΑΡΑΜΠΟΤΟΣ, ΥΠ.ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ

Περιεχόμενα

- Αθλητικά γεγονότα
- Διαχείριση γεγονότων (Event management)
- Διαχείριση Έργου (Project management)
- Case Study - Μελέτη περίπτωσης

Αθλητικό Γεγονός

- Τι είναι αθλητικό γεγονός

Ως «αθλητικό γεγονός» μπορεί να θεωρηθεί μία εκδήλωση που πραγματοποιείται σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, με καθορισμένο τύπο και μορφή και με προσδιορισμένη χρονική διάρκεια, για συγκεκριμένους λόγους, ανταγωνιστικούς ή μη, έχοντας ως χαρακτηριστικό ένα ή περισσότερα αθλητικά δρώμενα.

Τα αθλητικά γεγονότα ή αθλητικές εκδηλώσεις διενεργούνται σε χώρους ή εγκαταστάσεις, που προσελκύουν μεγάλο αριθμό θεατών, είναι μικρής σχετικής χρονικής διάρκειας, και παρέχουν διευκολύνσεις που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή στον προγραμματισμό, το σχεδιασμό, τη διαχείριση και λειτουργία τους (Wootton & Stevens, 1995).

Κατηγορίες Αθλητικών Γεγονότων

Mega Events
Μεγάλες διοργανώσεις (**mega events**) όπως οι ολυμπιακοί αγώνες

Hallmark Events
Εκδηλώσεις "Σήμα κατατεθέν" (**hallmark events**), όπως ο γύρος της Γαλλίας με ποδήλατο (Tour de France)

Major Events
Εξέχουσες εκδηλώσεις (**major events**), όπως το Australian tennis Tournament και τέλος

Τοπικές Εκδηλώσεις
Τοπικές ή Κοινοτικές εκδηλώσεις, όπως η αθλητική διοργάνωση του Spetsathlon ή μικρότερων διοργανώσεων.

Διοργάνωση Γεγονότων

Η διοργάνωση γεγονότων - εκδηλώσεων απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και συγκεκριμένη στρατηγική, συμπεριλαμβανομένων της διαχείρισης των δραστηριοτήτων:

- της οργάνωσης
- της χρηματοδότησης
- της διαχείρισης του προσωπικού και των εθελοντών
- το σχεδιασμό του μάρκετινγκ
- των δημοσίων σχέσεων
- την οργάνωση της ασφάλειας και άλλων σχετικών

δραστηριοτήτων (Tassiopoulos, 2005).

Διαχείριση Γεγονότων

Η διαχείριση των γεγονότων - εκδηλώσεων (event management) περιλαμβάνει τον συντονισμό όλων των καθηκόντων και αναγκαίων δραστηριοτήτων για την εκτέλεση μιας εκδήλωσης που αφορούν:

- τη **στρατηγική** της,
- το **σχεδιασμό**,
- την **εφαρμογή**
- τον **έλεγχο**



βάσει των αρχών του event management και των μεθόδων του project management (Thomas, Hermes & Loos, 2008)

Διαχείριση Αθλητικών Γεγονότων

Η δουλειά ενός επαγγελματία διοργανωτή αθλητικών γεγονότων εκδηλώσεων περιλαμβάνει την επίβλεψη και οργάνωση της εκδήλωσης, την έρευνα, το σχεδιασμό, τον έλεγχο και την αξιολόγηση όλου του φάσματος του αθλητικού γεγονότος και των αντίστοιχων δραστηριοτήτων.

Διαχείριση Αθλητικών Γεγονότων

Σύμφωνα με τους Cronje και συν. (2003), τα στάδια οργάνωσης και διαχείρισης μίας αθλητικής εκδήλωσης περιλαμβάνουν :

- τη γενική διαχείριση
- τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων
- τη χρηματοοικονομική διοίκηση
- τη διαχείριση προϋπολογισμού
- τη διαχείριση των λοιπών νομικών πτυχών
- τη διαχείριση των μεταφορών
- τις δημόσιες σχέσεις
- το μάρκετινγκ
- τη διαχείριση των εισιτηρίων (‘ticketing’)
- τη διαχείριση κινδύνων

Σχεδιασμός Αθλητικών Γεγονότων

Το αποτέλεσμα της λειτουργίας του σχεδιασμού είναι το «**πλάνο του αθλητικού γεγονότος**».

- Το «πλάνο» είναι ένας δημιουργικός και ρεαλιστικός χάρτης που περιγράφει τον τρόπο που θα επιτευχθούν οι στόχοι του γεγονότος.

- Αποτελεί δέσμευση για τους οργανωτές και τους υποστηρικτές του αθλητικού γεγονότος.

(Θεοδωράκης Ν. , 2013)

Υλοποίηση Αθλητικού Γεγονότος



Στην φάση της υλοποίησης όσα έχουν προγραμματιστεί και σχεδιαστεί, στο στάδιο του προγραμματισμού , σχεδιασμού θα τεθούν σε λειτουργία. Οι διαδικασίες που συνθέτουν την ομάδα των διαδικασιών υλοποίησης θα λειτουργήσουν ταυτόχρονα προκειμένου να υπάρξει συντονισμός όλων των λειτουργικών περιοχών, των ανθρώπων και άλλων πόρων για την πραγματοποίηση του αθλητικού γεγονότος.

Έλεγχος Αθλητικού Γεγονότος

- Σε όλη την διάρκεια του αθλητικού γεγονότος υπάρχει συνεχής παρατήρηση για την ομαλή εξέλιξη των εργασιών ,ώστε να διακρίνονται εγκαίρως πιθανά προβλήματα και να γίνονται διορθωτικές κινήσεις.(Μανδραβέλλη,2011)

Απολογισμός- Επανασχεδιασμός Αθλητικού Γεγονότος

Ο απολογισμός βοηθάει να επισημάνουμε τι πήγε καλά και τι όχι,
ώστε να το βελτιώσουμε την επόμενη φορά.

- Συσκέψεις προσωπικού
- Ερωτηματολόγιο συμμετεχόντων (αθλητών- εθελοντών- θεατών)
- Online δημοσκοπήσεις (polls) – Χρήση social media/τεχνολογικών μέσων

Αθλητικό Γεγονός ως έργο

Ένα αθλητικό γεγονός εμπεριέχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός έργου, χαρακτηρίζεται από:

- Προσωρινότητα
- Μοναδικότητα
- Προοδευτική ανάπτυξη

Και η αθλητική διοργάνωση υπόκειται στους 3 περιοριστικούς παράγοντες των έργων:

1. Χρόνος
2. Κόστος
3. Ποιότητα

Διοργάνωση αθλητικού γεγονότος στο πλαίσιο της διαχείρισης έργου

Η οργάνωση ενός αθλητικού γεγονότος μπορεί να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της διαχείρισης έργου ή πιο συγκεκριμένα της διαχείρισης γεγονότος.

Τα 3 κύρια χαρακτηριστικά της διαχείρισης έργου:

- **Ο Διευθυντής έργου**

- **Η Ομάδα έργου**

- **Σύστημα διοίκησης έργου**
  (έτσι ώστε διευθυντής και ομάδα να λειτουργούν ενιαία)

Διαχείριση Έργου
Φάσεις Διοργάνωσης ενός αθλητικού γεγονότος

Οι εργασίες για την διοργάνωση ενός αθλητικού γεγονότος από την ανάληψη της ευθύνης της διοργάνωσης μέχρι την πραγματοποίηση του περνούν μέσα από τις 4 φάσεις του κύκλου ζωής ενός έργου:

1.Φάση αρχικής σύλληψης

2.Φάση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

3.Φάση Υλοποίησης και εκτέλεσης

4. Φάση θέσης σε λειτουργία και παράδοσης

Διαχείριση Έργου
Project Management

Η διαδικασία της οργάνωσης και διαχείρισης ενός αθλητικού γεγονότος μπορεί να οργανωθεί στις 5 μεγάλες ομάδες συστημικης διαχείρισης έργου.

Οι ομάδες:

1.Διαδικασιών Εκκίνησης

2.Διαδικασιών Σχεδιασμού & Προγραμματισμού


3.Διαδικασιών Εκτέλεσης

4.Διαδικασιών Ελέγχου

5.Διαδικασιών κλεισίματος

Plan - Do - Check - Act Cycle

PDCA

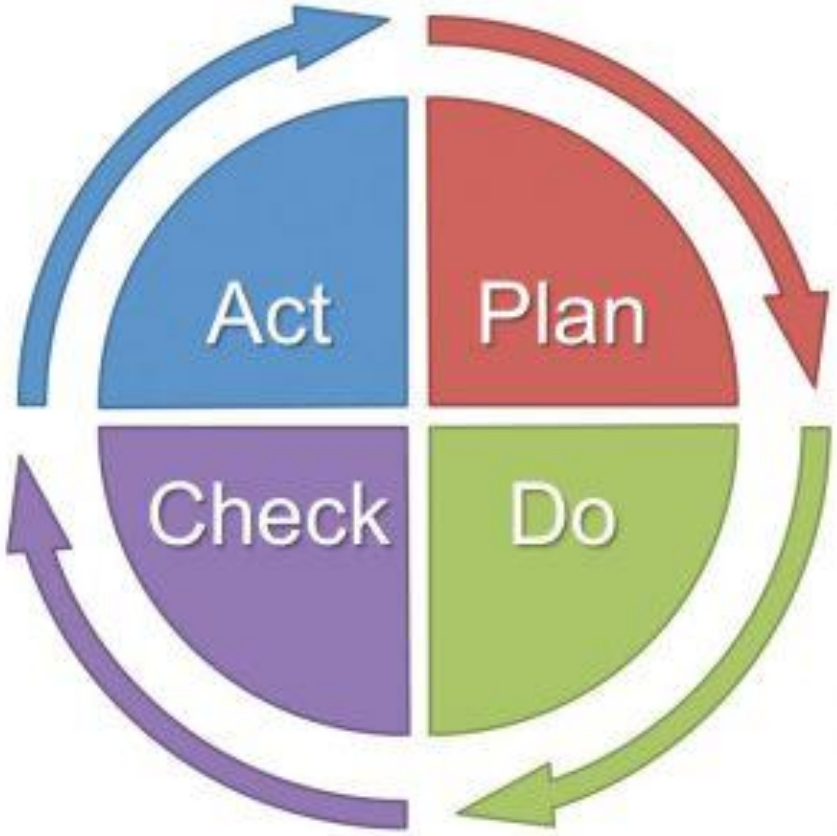

Διοργάνωση Αθλητικών γεγονότων

Οι ενέργειες που απαιτούνται από την μεριά του διοργανωτή κατά τη διάρκεια ενός αθλητικού γεγονότος χωρίζονται σε 3 φάσεις:

1. **Πριν το event**
2. **Κατά την διάρκεια**
3. **Μετά το event**

Πριν το αθλητικό γεγονός

Επιλογή κατάλληλου χωροταξικά χώρου που να τηρεί τις προδιαγραφές που απαιτείται

Θέσπιση Ομάδας έργου

Συμφωνίες με Φορείς / Προμηθευτές

Site διοργάνωσης

Λειτουργία Γραμματείας /Εγγραφών

Ηλεκτρονικές εγγραφές (μέσω site ή πλατφόρμας διαχείρισης αθλητικών γεγονότων)

Νομικό πλαίσιο - Αδειοδότηση

Παραγγελίες εξοπλισμού – κλείσιμο συμφωνιών

Προυπολογισμός

Αγωνιστικός σχεδιασμός – Τεχνικές συσκέψεις
Εθελοντές
Μεταφορές
Διαμονή
Διατροφή
Διαχείριση Κινδύνων - Risk Management
Προώθηση/Επικοινωνία
Χορηγίες
Εκτυπώσεις
Έπαθλα
Ηχητικά
Εκφωνητής

Κατά την διάρκεια του αθλητικού γεγονότος

Στήσιμο διοργάνωσης

Branding (Πανό,Banners, Rollup, Backdrop, beach flags κτλ)

Γραμματειακή υποστήριξη (Εγγραφές / Παραλαβή BIB)

Συνεργασία – επικοινωνία με ομάδα έργου

Αυτοψία Αγωνιστικού χώρου

Βελτιωτικές διορθώσεις

Ασφάλεια (Σχέδια έκτακτων αναγκών / εκκενώσεων κτλ)

Σταθμοί ανεφοδιασμού (Νερά – Διατροφή)

Σημεία τοποθέτησης εθελοντών (Διασφάλιση επικοινωνιών ασύρματοι – τηλέφωνα / τροφοδοσία

Τελετή έναρξης / Pre game Event – παράλληλες δράσεις

Ιατρική κάλυψη (Διασώστες , Ιατρός, ασθενοφόρο)
Χρονομέτρηση - Κριτές (online αποτελέσματα – άλλες online εφαρμογές)
Περίπτερα χορηγών / διαφημιζομένων
Σημάνσεις
WC
Υγειονομικά πρωτόκολλα
Φωτογράφος / Βίντεο
Social media
Ηχητικά / DJ
Εκφωνητής -παρουσιαστής
Απονομές
Τελετή λήξης

Μετά το αθλητικό γεγονός

Απολογισμός

Μέτρηση ικανοποίησης εμπλεκομένων μερών

Διορθωτικές κινήσεις

Στάδια οργάνωσης αθλητικών αγώνων

Για την οργάνωση των αθλητικών αγώνων, καθώς και για την επιτυχία αυτών, ακολουθείται μια διαδικασία πέντε (5) αλληλένδετων σταδίων (Αυθίνος, 2000):

1. Διερεύνηση εφικτότητας
2. Ανάπτυξη συνεργασιών υποστήριξης
3. Προετοιμασία αγώνων
4. Διεξαγωγή αγώνων
5. Ολοκλήρωση αγώνων

Διερεύνηση εφικτότητας

1) Ορισμός είδους – εμβέλειας αγώνων
2) Ορισμός ημερομηνίας βάσει άλλων αθλητικών γεγονότων
3) Έλεγχος εγκαταστάσεων και τήρηση προϋποθέσεων βάσει κανονισμών
4) Οικονομική κάλυψη αγώνων
5) Αριθμητική και ποιοτική επάρκεια προσωπικού
6) Διαθέσιμος υλικοτεχνικός εξοπλισμός
7) Προκήρυξη αγώνων
8) Έγκριση από τη Διεθνή ή Εθνική Ομοσπονδία ανάλογα με την εμβέλεια των αγώνων

Ανάπτυξη συνεργασιών υποστήριξης

1) Διερεύνηση και κατοχύρωση απαραίτητων συνεργασιών

2) Έγκριση από Γ.Γ.Α. και ειδική οικονομική επιχορήγηση από αυτή

3) Σύναψη συμφωνίας για τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων

4) Εξασφάλιση υποστήριξης των αγώνων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Α΄ και Β΄ βαθμού)

5) Λοιπές συνεργασίες με μη αθλητικούς φορείς κυρίως, οι οποίοι επιδιώκουν άμεσο εισόδημα, έμμεσο εισόδημα είτε άυλα οφέλη.

Προετοιμασία αγώνων

1) Ορισμός Οργανωτικής, Εκτελεστικής και Επίτιμης Επιτροπής, αν υπάρχει.

2) Δημιουργία και στελέχωση τμημάτων – ομάδων εργασίας

3) Δημιουργία οργανογράμματος αγώνων

4) Σύναψη πλήρους πλάνου ευθύνης, εργασιών και συνεργασιών

5) Σύναψη αναλυτικού οικονομικού προϋπολογισμού

6) Ορισμός χρονοδιαγράμματος

7) Συγκέντρωση δηλώσεων συμμετοχής

Διεξαγωγή αγώνων

1) Υλοποίηση προγράμματος διεξαγωγής των αγώνων

2) Τήρηση Κανονισμού της Διεθνούς Ομοσπονδίας

3) Ορισμός αγωνοδίκους επιτροπής και επιτροπής ενστάσεων

4) Εξοπλισμός αγωνιστικού χώρου

5) Τεχνική σύσκεψη (τη μέρα διεξαγωγής ή το προηγούμενο βράδυ)

6) Μηχανοργάνωση – έκδοση αποτελεσμάτων

7) Εκφωνήσεις

8) Τελετές έναρξης – λήξης

9) Απονομές επάθλων

Ολοκλήρωση αγώνων

1) Αποπληρωμή τιμολογίων εξόδων και εξόφληση εργαζομένων

2) Έκδοση οικονομικού και διοικητικού απολογισμού

3) Έκδοση τελικών συγκεντρωτικών αγωνιστικών αποτελεσμάτων

4) Παράδοση φακέλων δημοσιότητας σε χορηγούς και συνεργάτες

5) Επιστροφή δανεισμένου ή ενοικιασμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού


6) Αξιολόγηση αγώνων σε επίπεδο:
I. Οικονομικό II. Οργανωτικό III. Συμμετοχής αθλητών IV. Ικανοποίησης θεατών, αθλητών, χορηγών και λοιπών εμπλεκομένων

7) Έκδοση αναμνηστικού σημειώματος

Χρονοδιάγραμμα

Δομημένη ανάλυση εργασιών του έργου	Αρ. δραστ	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ				ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ				ΜΑΡΤΙΟΣ	
		5 έως 11	12 έως 18	19 έως 25	26 έως 31	1 έως 8	9 έως 15	16 έως 22 Καθ Δευτ	23 έως 29	1 έως 6	7 έως 14
Γραφείο για προετοιμασία διοργάνωσης	Α										
Σύνταξη προϋπολογισμού	1										
Συμφωνίες με συνεργάτες	2										
Στελέχωση - προσωπικό	3										
Παραγωγή υλικού διοργάνωσης (αγώνων και μάρκετινγκ)	4										
Διαφήμιση – προβολή	5										
Πωλήσεις	6			[					)		
Προμήθεια αθλητικού υλικού διοργάνωσης	7			[	]						
Συντονισμός εμπλεκομένων στην υλοποίηση	8		[					]			
Υλοποίηση σε αθλητική εγκατάσταση	Β										
Συντονισμός αγωνιζόμενων στη διοργάνωση	9								[	)	
Προετοιμασία εγκατάστασης	10								[ ]		
Εξοπλισμός εγκατάστασης	11									[ ]	
Διεξαγωγή αγώνων	12									**[4-6]**	
Κλείσιμο διοργάνωσης	Γ										
Αξιολόγηση διοργάνωσης	13										[ ]
Διαχειριση γνώσης	14										[ ]

Αυθίνος, 2015

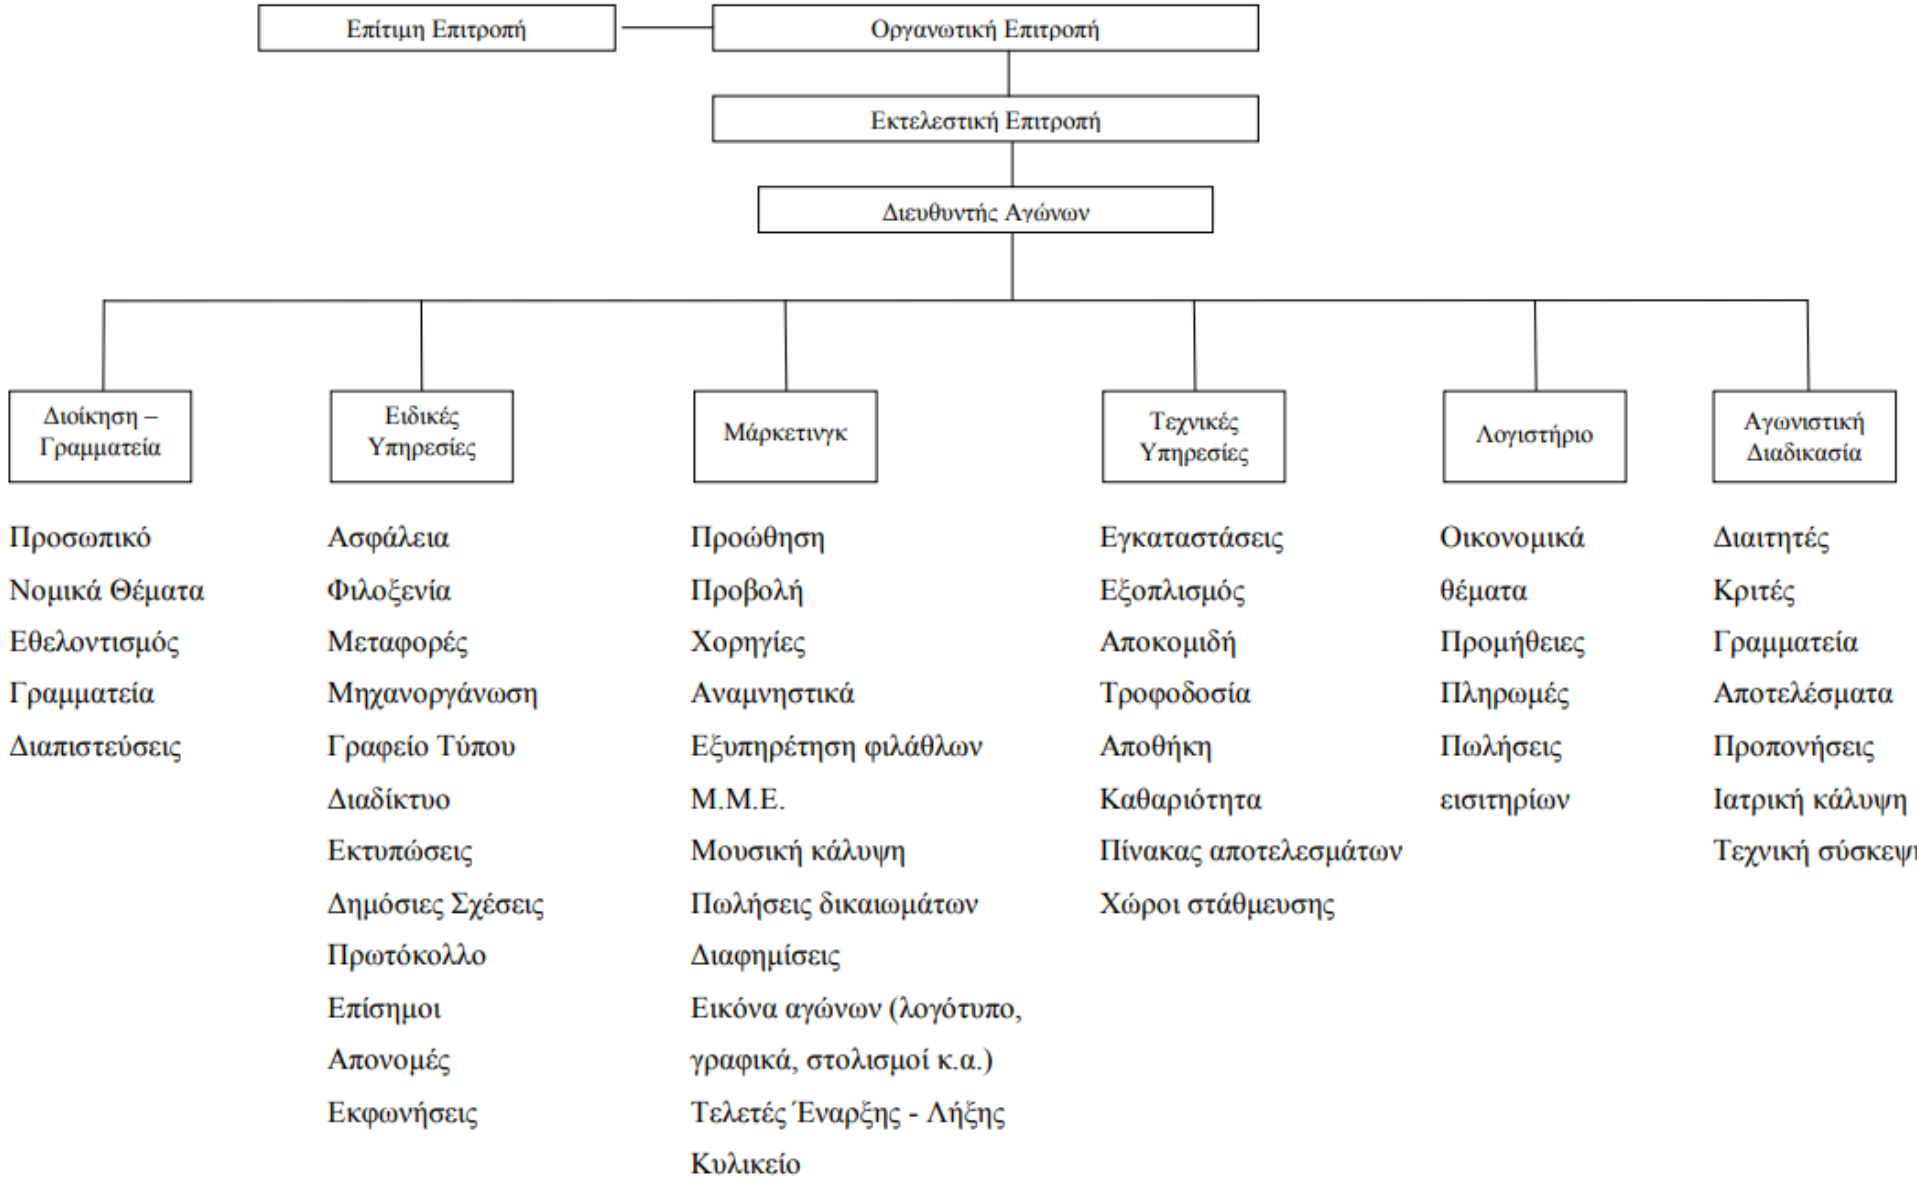

Σχεδιάγραμμα 1. Ενδεικτικό οργανόγραμμα αθλητικών αγώνων ηπειρωτικού και παγκόσμιου επιπέδου (Αυθίνος, 2000)


Προϋπολογισμός (μη κερδοσκοπικό event)

		ΔΗΜΟΣ XXXXXXXXXX Project				
		Activity	Description		Budget Estimation	Lead
			Details	Quantity		
	ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΚΩΝΟΙ		100		ΔΗΜΟΣ
		ΤΡΑΠΕΖΙΑ / ΚΑΡΕΚΛΕΣ				ΔΗΜΟΣ
		ΑΨΙΔΑ	αψίδα x 4 ημέρες	2	500.00 €	XXXX Company
		BANNERS ΑΨΙΔΑΣ		12	420.00 €	PRINT
		ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	ΤΕΡΜΑΤΑ - ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ		500.00 €	
		ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΜΑΣΚΕΣ, ΑΝΤΙΣΥΠΤΙΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ			ΔΗΜΟΣ
		ΗΧΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	Ηχητική κάλυψη με μουσική στις δράσεις Σαββατου και Κυριακής στις πλατείες		500.00 €	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
		ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΤΛ		100.00 €	
	PROMOTION	T-shirts for staff / εθελοντών	3 ευρώ τεχνικό tshirt με 2 λογότυπα	30	90.00 €	
		POLO μπλουζάκια		25	225.00 €	
		Παιδικά T-shirt	Μπλουζάκια για 220 παιδιά που θα λάβουν μέρος τις	220	660.00 €	
		Μετάλλια συμμετοχής	220	220	396.00 €	
		roll up	3	3	120.00 €	
		POSTER	80	80	80.00 €	
		FLYERS A5	2500	2,500	120.00 €	
		Διοργανωτικά κόστη	•ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ •ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ Κ ΧΟΡΗΓΟΥΣ •ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ •ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΠΟΥ		1,000.00 €	
		SOCIAL MEDIA MANAGEMENT	Δημιουργία και διαχείρηση σελίδων facebook (& Instagram *Εσε ετήσια βάση και έμφαση στο Event		1,000.00 €	
		WEBINAR	ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ WEBINAR		500.00 €	
		ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	10	950.00 €	
			ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ (ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΑΘΛΗΤΕΣ -	1	100.00 €	
			ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ	1	200.00 €	
			ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ	1	200.00 €	
			ΒΙΝΤΕΟ / ΜΟΝΤΑΖ	1	800.00 €	
			ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ	1	400.00 €	
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ EVENT				8,861 €	
					10,987.64 €	



Μελέτη περίπτωσης

Διοργάνωση δρομικού γεγονότος



Διοργάνωση δρομικού γεγονότος

Οργανόγραμμα

Πρόεδρος Οργανωτικής επιτροπής

Γενικός συντονιστής

Τεχνικός Υπεύθυνος


Υπεύθυνος Τύπου

Υπ. Εθελοντισμού

Υπ. Γραμματείας

Υπ. Ιατρικής Ομάδας

Εγκρίσεις από: Τροχαία/Δημοτική αστυνομία/Αστικές συγκοινωνίες /Δασική Υπηρεσία / Λιμενικό / ΣΕΓΑΣ



Διοργάνωση δρομικού γεγονότος

Προκήρυξη Αγώνα
-Ρήτρες (για την υγεία των δρομέων) – Ιατρικές βεβαιώσεις(για παιδικούς αγώνες)
-Δικαιώματα Φωτογραφιών GDPR

Ανακοίνωση αγώνα στα ΜΜΕ / Δελτία τύπου (παραδοσιακά & νέα ΜΜΕ)

Έπαθλα για νικητές

Μετάλλια για νικητές / συμμετέχοντες

Διπλώματα συμμετοχής / ηλεκτρονικά

Διοργάνωση δρομικού γεγονότος



Ηλεκτρονική Χρονομέτρηση

Bib Numbers


Ε- εφαρμογές

Διοργάνωση δρομικού γεγονότος

Προώθηση αγώνα
Πανό σε κεντρικά σημεία
Αφίσες
Πινακίδες Δήμου
Κοινωνικά δίκτυα

Προϋπολογισμός


Χορηγίες

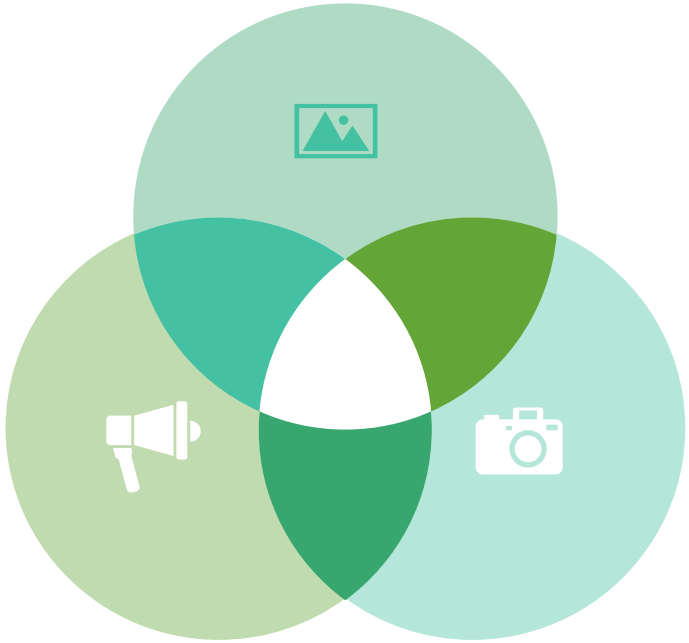

Διοργάνωση δρομικού γεγονότος

Εθελοντές

Έγγραφες οδηγίες
Ενημέρωση για καθήκοντα
Εκπαίδευση για έκτακτα περιστατικά
Ρουχισμός διοργάνωσης / νερό-φαγητό
Λίστα αριθμών τηλεφώνων ομάδας / Ασύρματοι

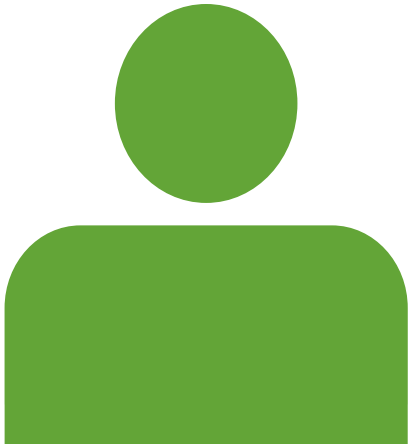

Διοργάνωση δρομικού γεγονότος

- **Υπηρεσίες καθαριότητας Δήμου**
  Περιβαλλοντικό αποτύπωμα

- **Σηματοδότηση**
  Κατευθυντήρια βέλη
  Χιλιομετρικές ενδείξεις
  (Σπρέι – ταμπέλες – σημαίες)

- **WC** - Τουαλέτες
  Εκκίνηση-Τερματισμός (καθαριότητα)

Διοργάνωση δρομικού γεγονότος

- **Σταθμοί υδροδοσίας - τροφοδοσίας**
  Ανάλογα με το μέγεθος του αγώνα
- **Σταθμοί Πρώτων Βοηθειών**
  Παρουσία διασωστών & ασθενοφόρου / Γνωστοποίηση στο ΕΚΑΒ / Ιατρός
- **Φύλαξη** προσωπικών αντικειμένων συμμετεχόντων
- **Μικροφωνική Εγκατάσταση**
  Ήχος – Μουσική – Dj –μικρόφωνα (έναρξη-τερματισμός)

Διοργάνωση δρομικού γεγονότος

Παρουσίαση αγώνων – Εκφωνητής
1 ώρα πριν – 1 ώρα μετά

Τήρηση Υγειονομικών πρωτόκολλων

Αποστάσεις – Μάσκες – Εκκινήσεις – Έλεγχος πιστοποιητικών

Απονομές
Βάθρο νικητών – Backdrop (Πανό χορηγών)



Διοργάνωση δρομικού γεγονότος

Απολογισμός


- Σε όλους τους επιμέρους τομείς με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
- Προσδιορισμός λαθών, παραλείψεων
- Βελτίωση διαδικασιών
- Καλύτεροι μελλοντικοί αγώνες

Αθλητικά γεγονότα Δημοτικών αθλητικών οργανισμών

Στην τελική ευθεία ο 27ος Ποδηλατικός Γύρος της Αθήνας | Εγγραφές δια ζώσης και το Σάββατο 28 Μαΐου

26 ΜΑΪΟΥ 2022



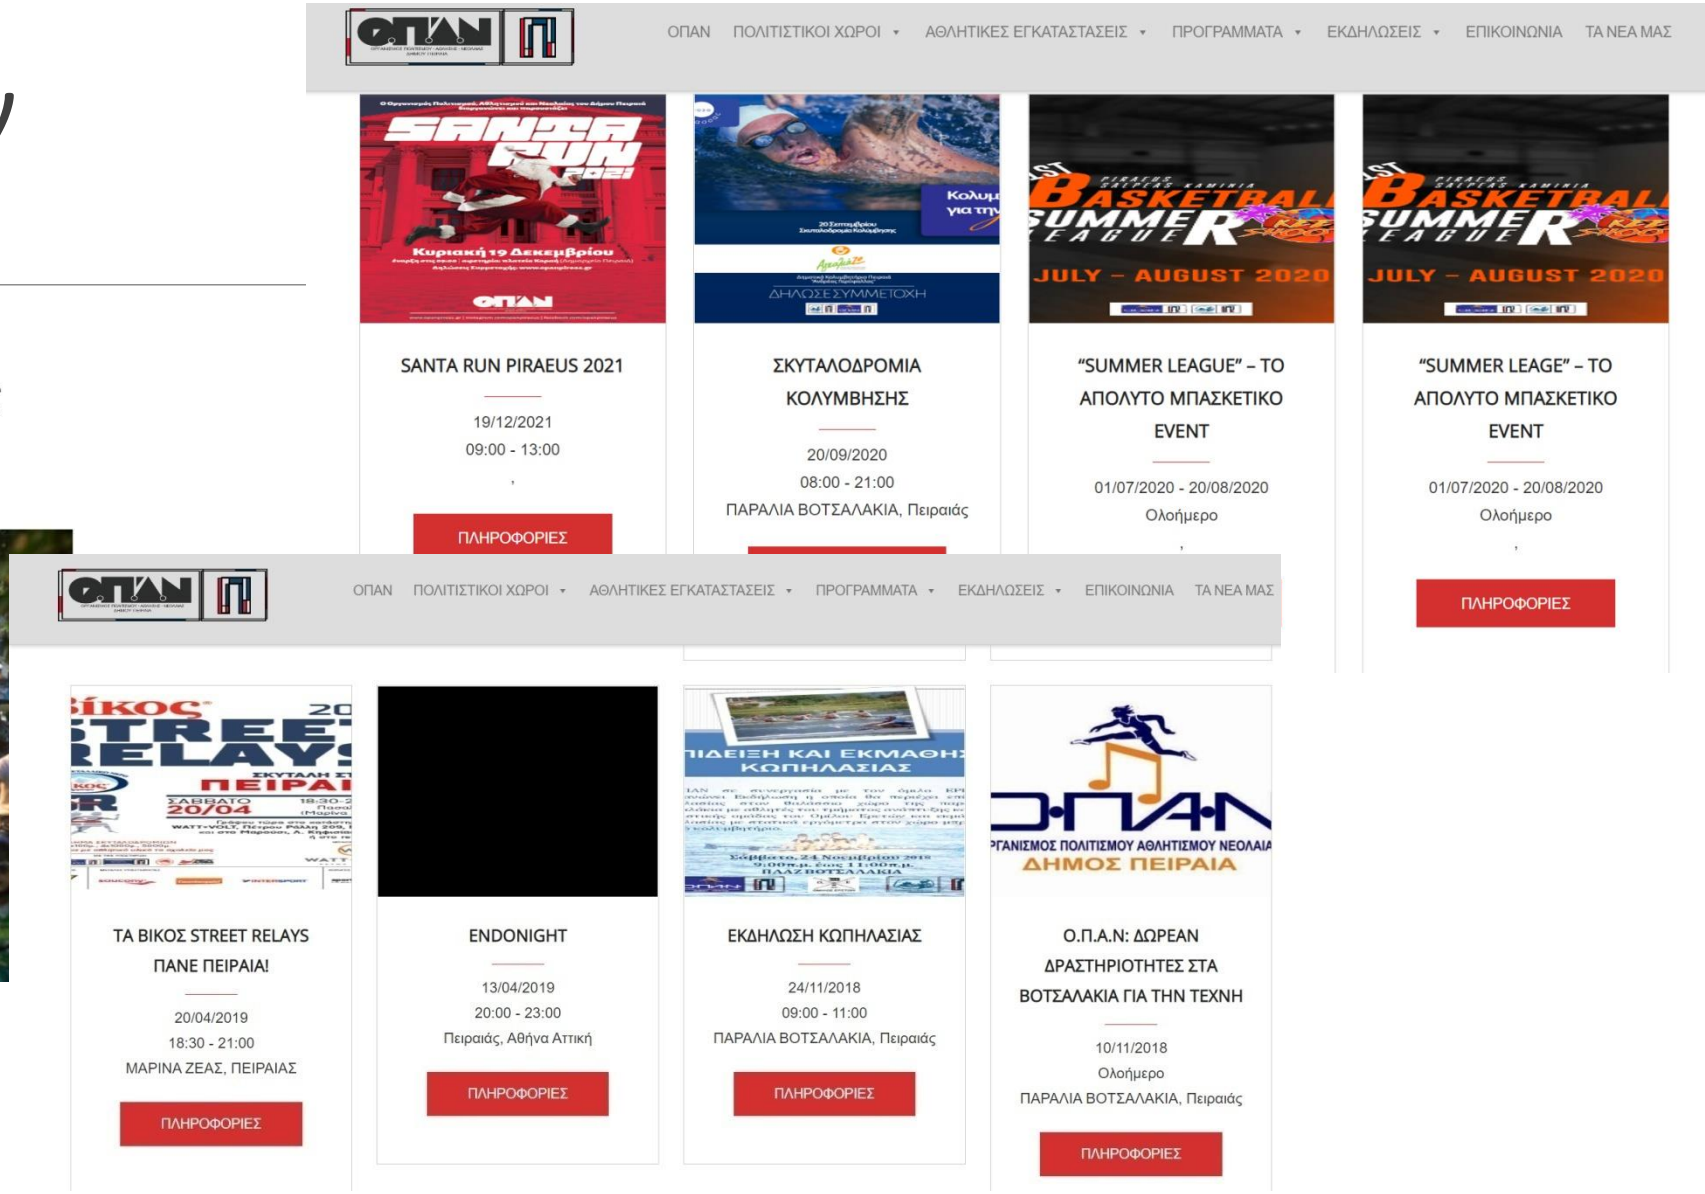

ΣΕΦΑΑ-ΔΠΘ
Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΤΕΦΑΑ
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ | DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE

Π.Ε.Δ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

SPORT REGENERATION

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜ-Θ

Αθλητικά γεγονότα

Φωτογραφίες




227-1
265-1
132-4


105-3
105-2
03-1
9-1


ΒΙΚΟΣ
ΒΙΚΟΣ
ΒΙΚΟΣ
Ζαχαροχώρια



SUNSET RACE
ΔΗΜΟΣ
ΣΕΡΙΦΟΥ


"MARIANNA
STUDIOS"





RUN
TOGETHER
saucony
INTERSPORT
realfm97.8
RUN
TOGETHER
INTERSPORT
saucony


RUN
TOGETHER
INTERSPORT
saucony

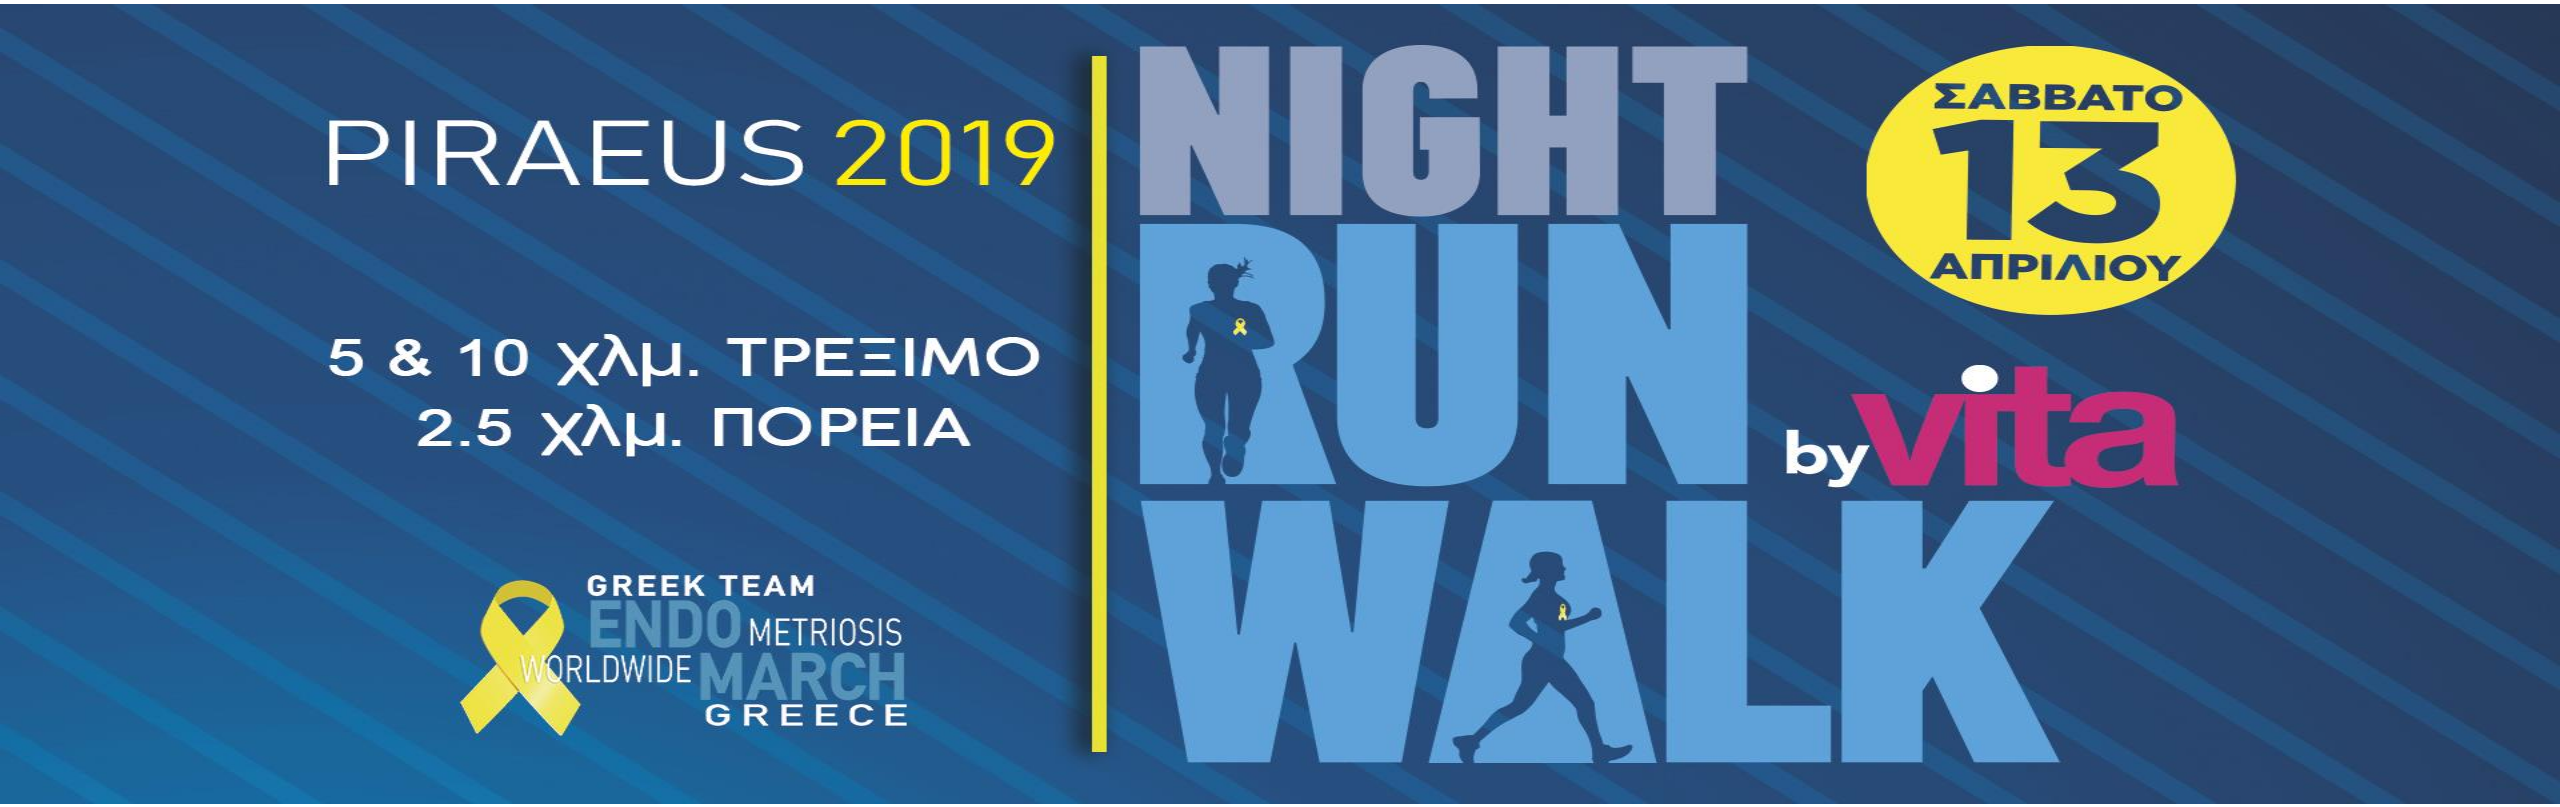

PIRAEUS 2019
5 & 10 χλμ. ΤΡΕΞΙΜΟ
2.5 χλμ. ΠΟΡΕΙΑ
GREEK TEAM
ENDO METRIOSIS
WORLDWIDE MARCH
GREECE
NIGHT
RUN
WALK
by vita
ΣΑΒΒΑΤΟ
13
ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ENDO METRIOSIS
WORLDWIDE MARCH
GREECE



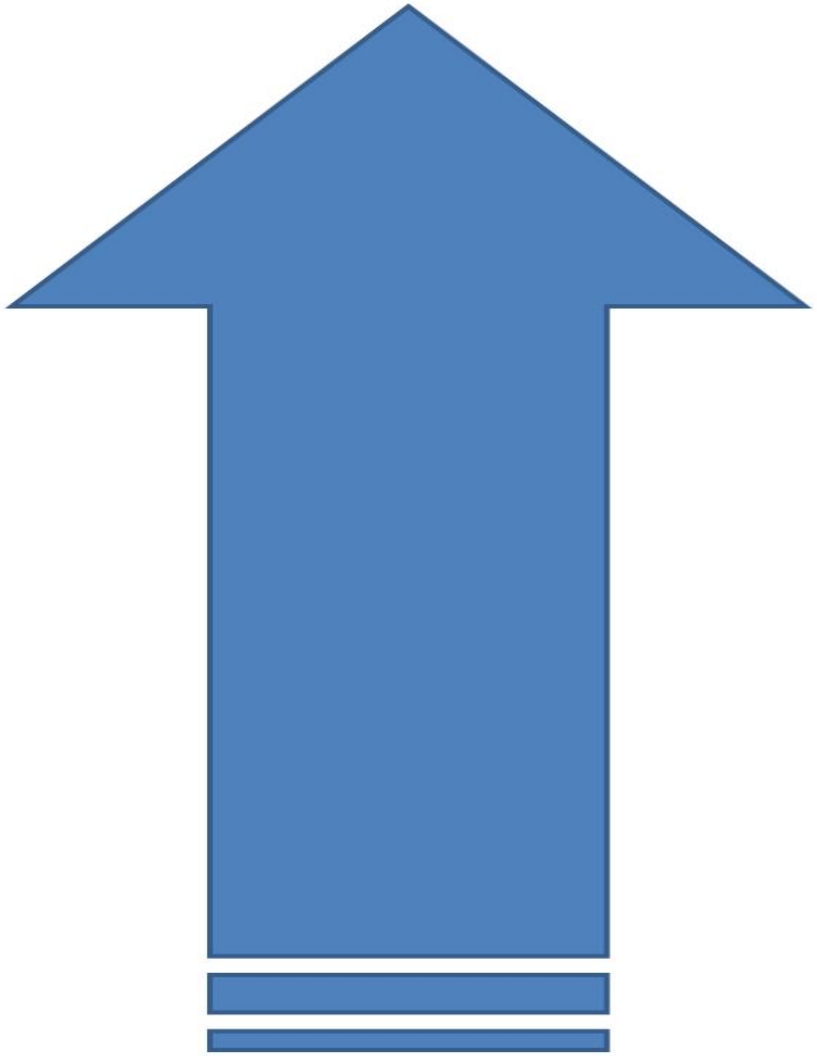


Κανελλόπουλου &
Καραολή και Δημητρίου
ΡΑΛΛΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ...
Ελλήνων Ηρώων &
Καραολή και Δημητρίου
5k 10k
Z1
Z2
Z3
Z4
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
ΤΖΑΒΕΛΛΑ
ΠΡΟΦΗΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
Αστικές Πύλες
Αρχαίου Πειραιά
Τζαβέλλα & Λεωφόρος
Αλεξάνδρου...
ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΣΤΑΔΙΟ
Ακτή Μουτσοπούλου &
Γρηγορίου Λαμπράκη
Λεωφ. Βασιλέως
Γεωργίου Β & Λεωφ...
Μνημείο Γενοκτονίας
των Ελλήνων του...
Θέατρο Δελφινάριο
Μενάνδρειο
Καραϊσκάκη
Σολωμού
Α.Κ.
Ποσειδώνος
ENDO METRIOSIS
WORLDWIDE MARCH
GREECE

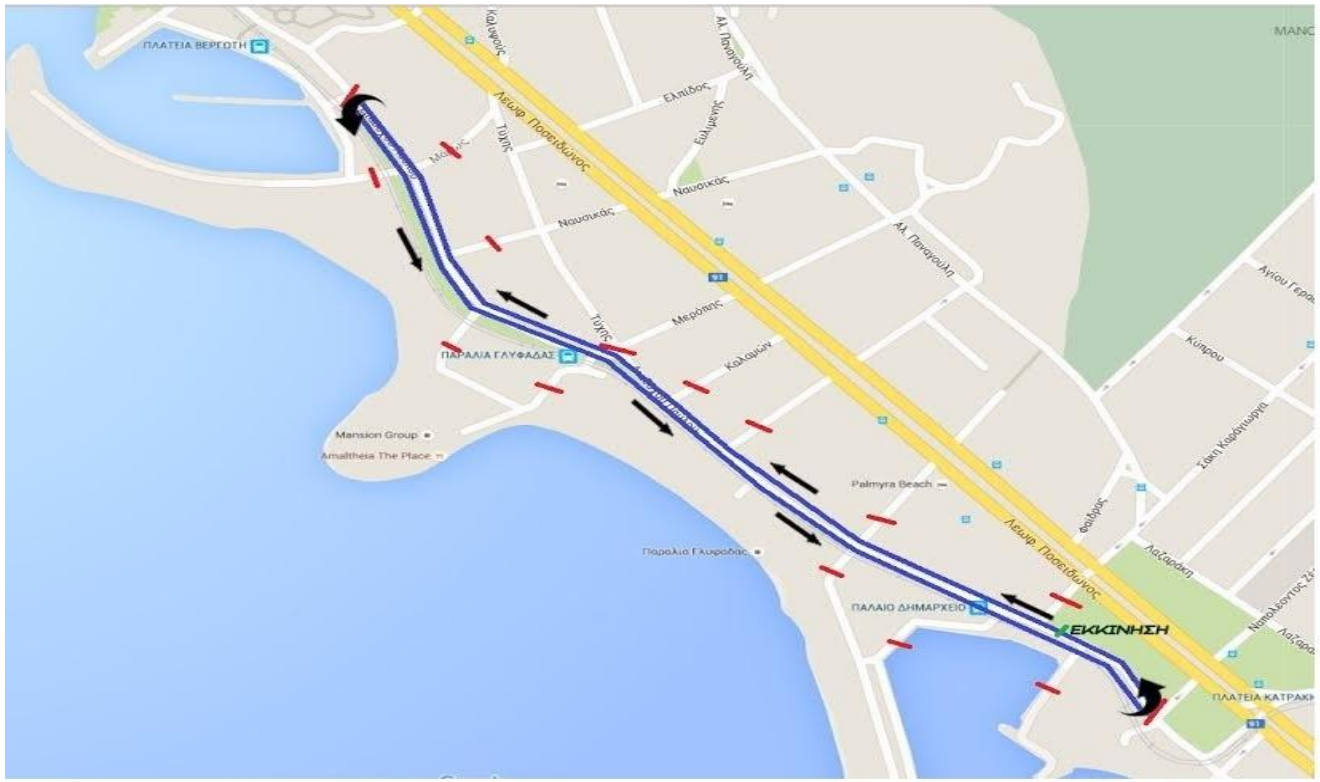

ΚΥΡΙΑΚΗ
09/04
2017

11:30-14:00
Παραλία
Γλυφάδας

Δήμος Γλυφάδας

Βίκος
STREET
RELAYS


Σκυτάλη στη
ΓΛΥΦΑΔΑ
STREET
RELAYS

ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΕΣ ΔΡΟΜΟΥ
4x50μ., 4x100μ., 4x2500μ., 2x5000μ.
και ατομικός αγώνας τρεξίματος 10χλμ.

Τρέχουμε για το
Make A Wish




RUN TOGETHER

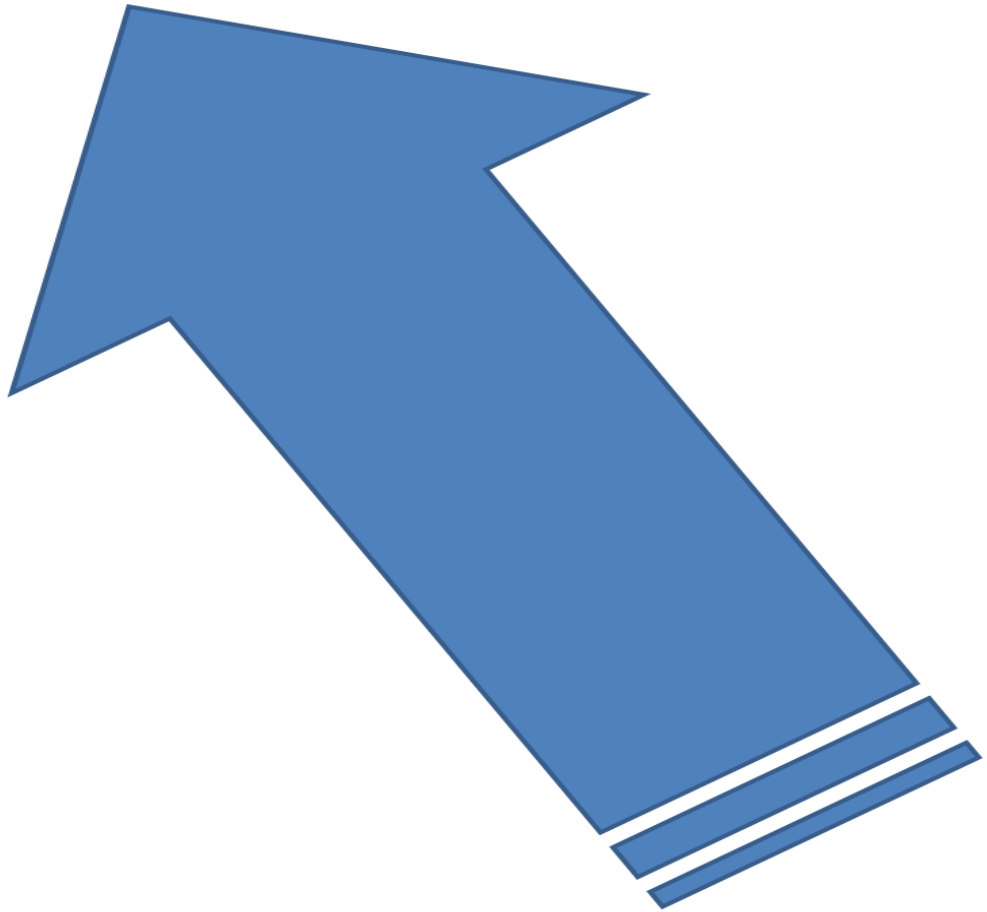

RUN TOGETHER

2 5 8

KM

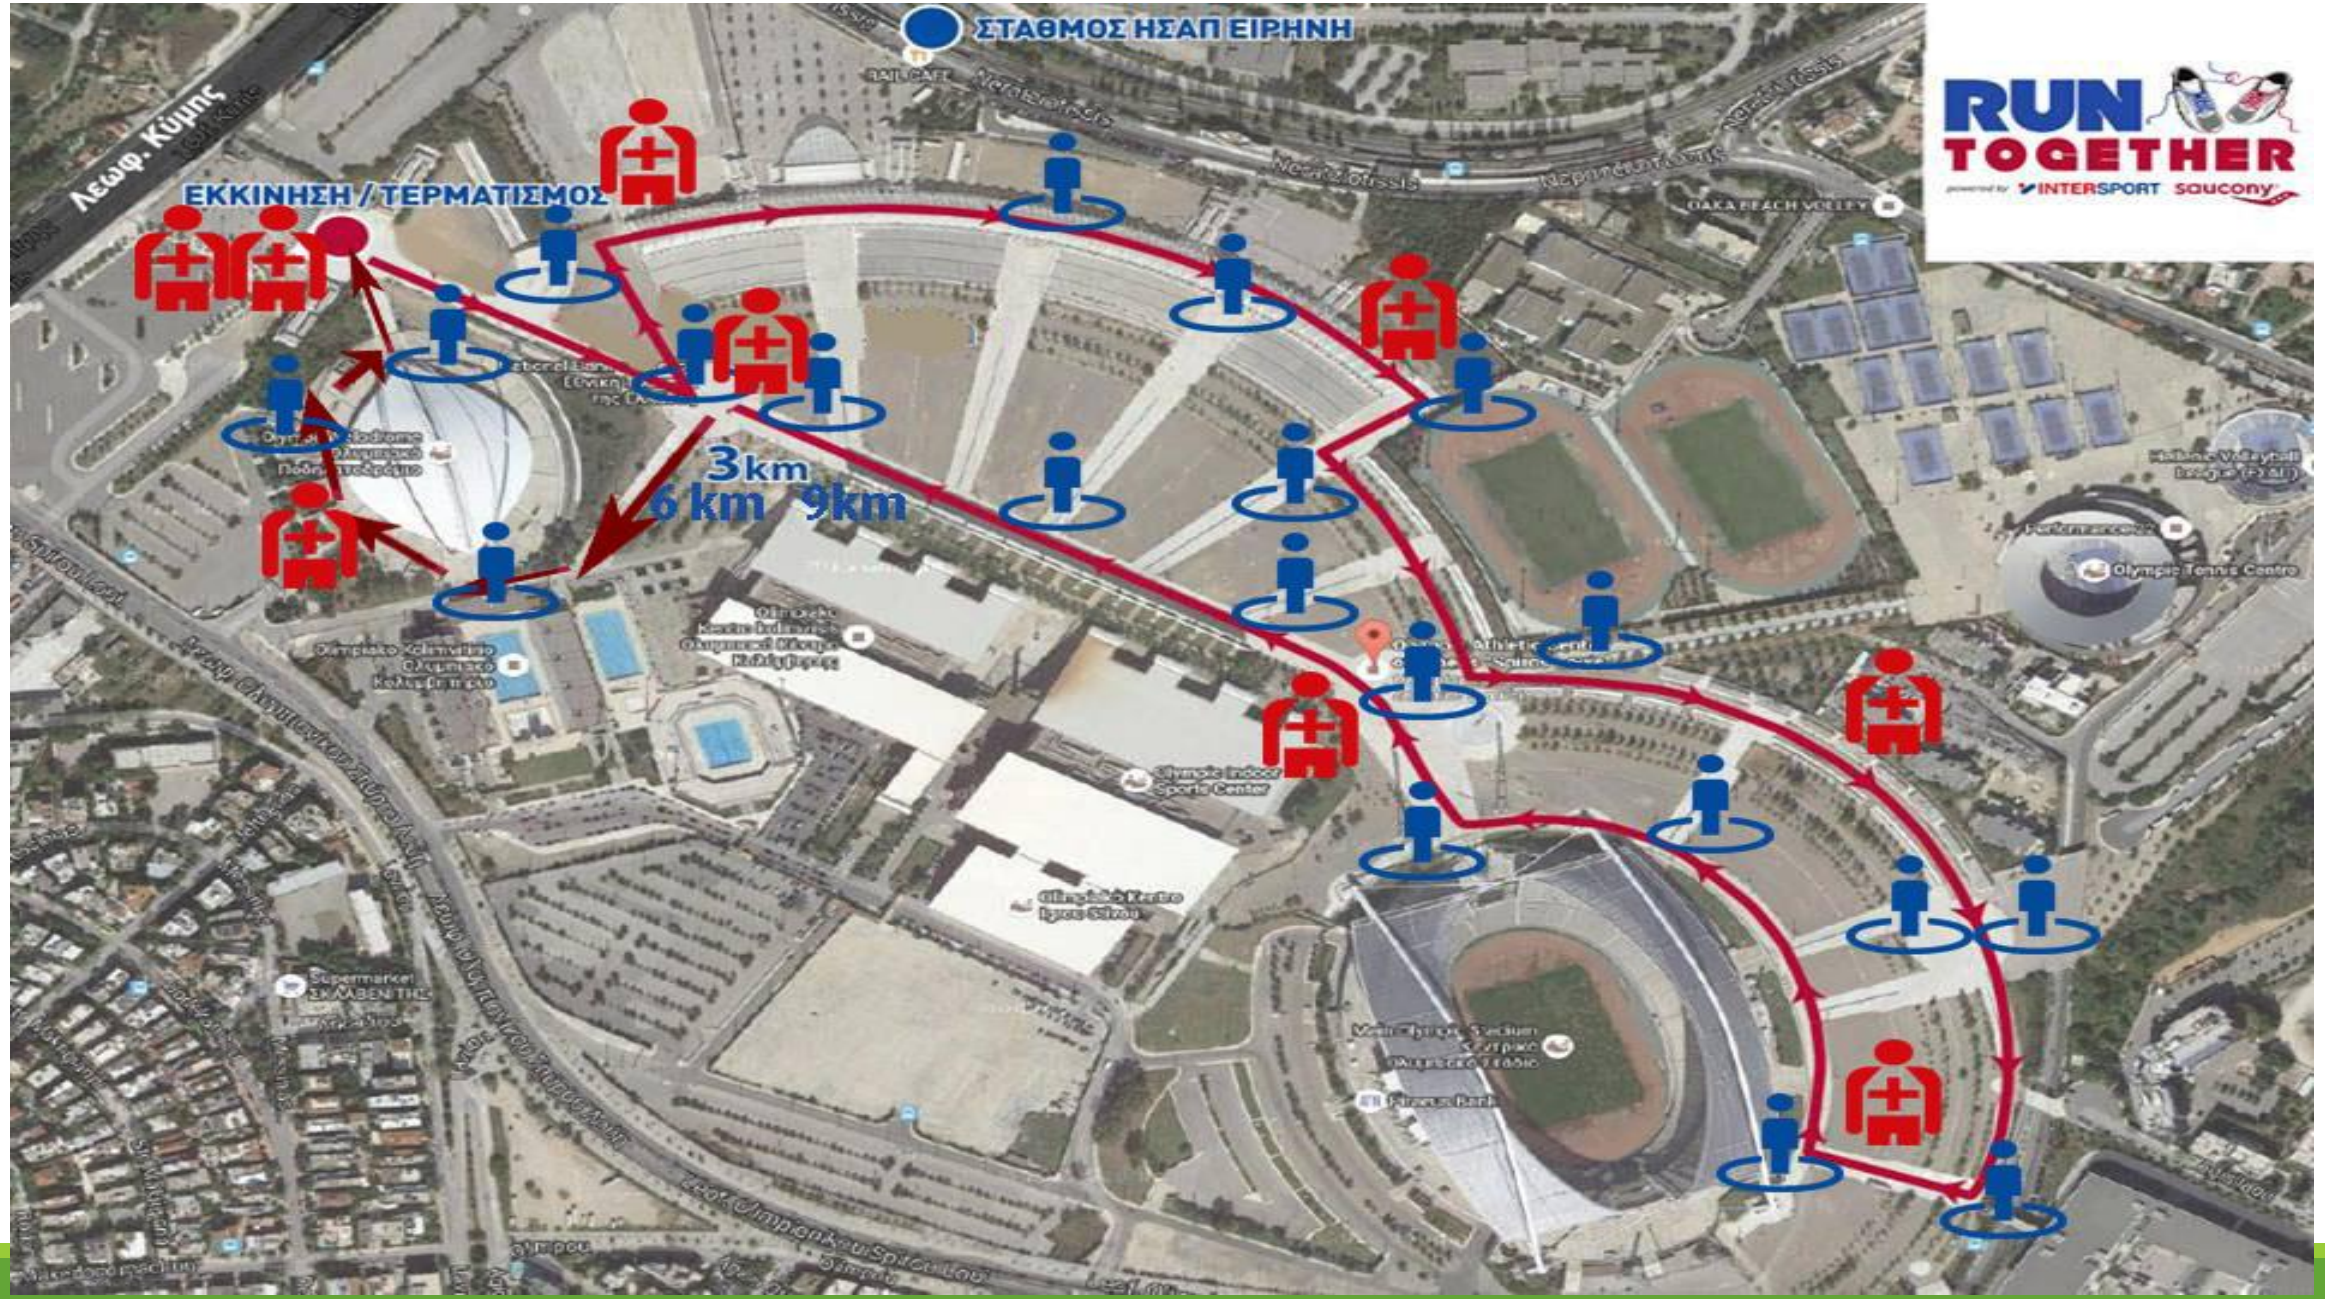
ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ / ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
3km
6 km
9km
RUN TOGETHER
INTERSPORT
saucony



ΕΚΚΙΝΗΣΗ

20ΚΜ

START



ΕΚΚΙΝΗΣΗ

5Κ 10Κ

START

SERIFOS SUNSET RACE

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ




FIRST AID

SERIFOS SUNSET RACE

ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΡΟΥ



WATER STATION

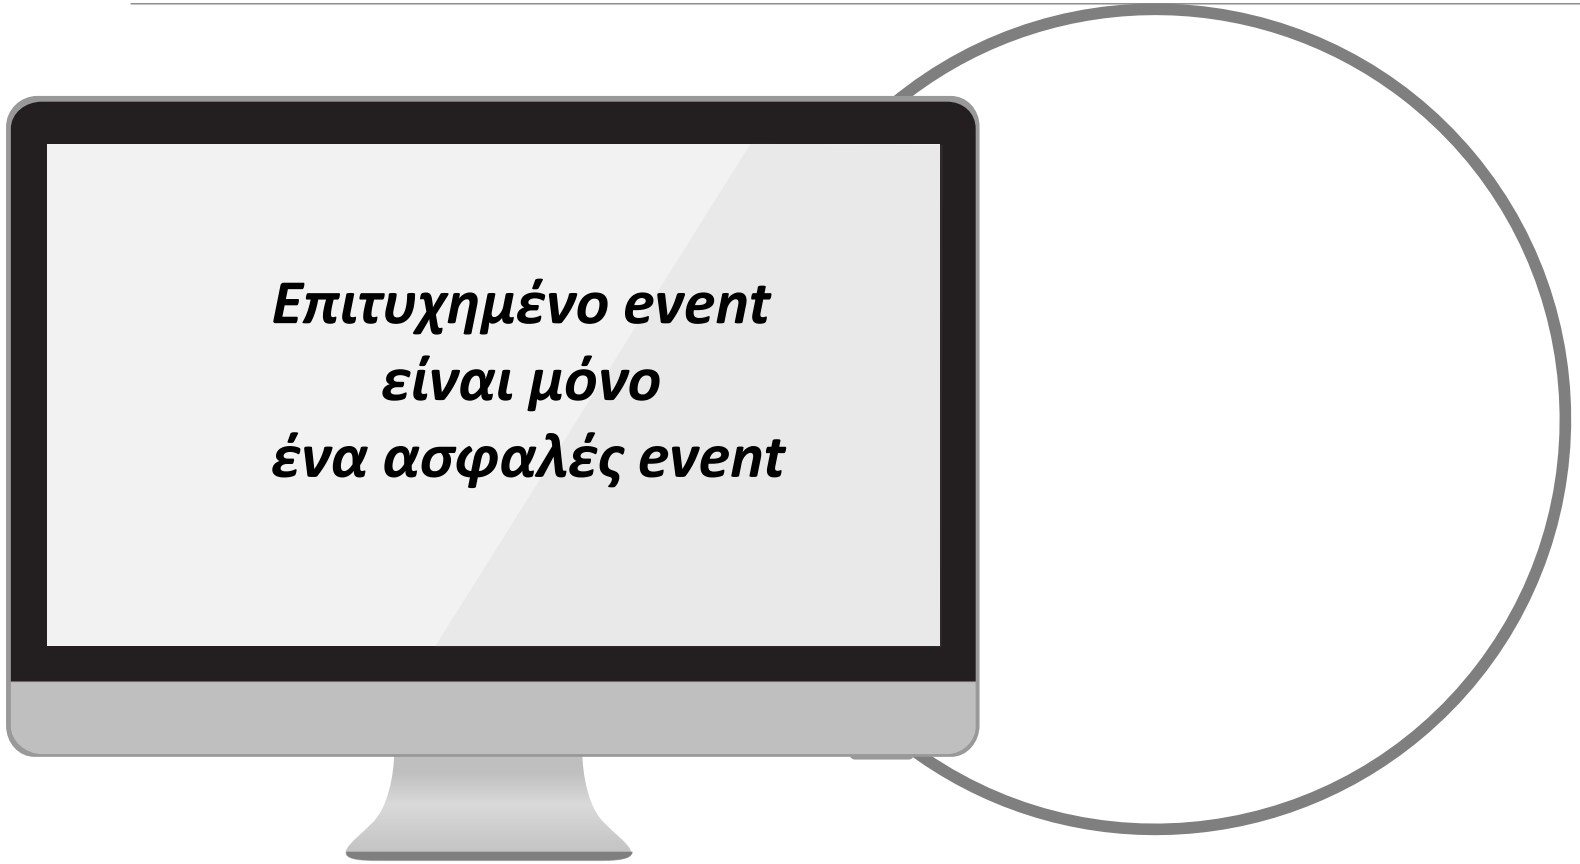
Επιτυχημένο event
είναι μόνο
ένα ασφαλές event

THANK YOU

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

